



Observatoire de la forêt méditerranéenne

Mise en place du débroussaillage obligatoire Méthode générale : Exemple de la commune du Plan de la Tour

Phase 1 : Animation – sensibilisation

Objectif : Vivre avec le feu

Moyens : - Visite "Diagnostic"

- Réunions publiques
- Visite "Conseil"


Calendrier : Février à Juillet 2003

Les Outils : - Photographie aérienne

- Cadastre numérisé
- Relevé de propriété

Ressource : - SIVOM (SIG)

- Commune (Service urbanisme)

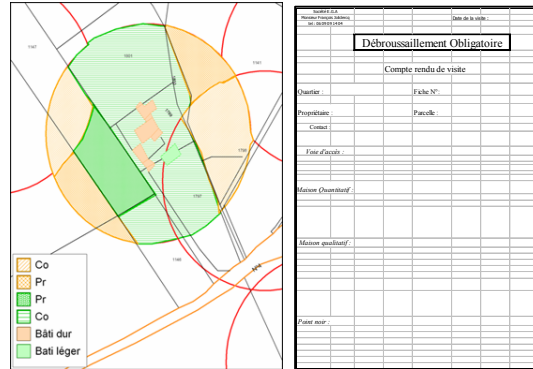

Visite "Diagnostic"

Objectif :

- Etat des lieux
- Réglementation (Rappel)
- Sécurité

[356 habitations hors zone U]

Compte Rendu :

- Extrait du plan cadastral
- Fiche propriétaire
- Guide Région
- Liste entreprises
- Courrier(s) accompagnateur(s)

Ressource : Commune

Réunions publiques

Objectif :

- Informer le maximum de propriétaires
- Engager un débat (commune / propriétaires)

Calendrier : Période de vacances scolaires

[3 réunions au total / ~ 150 personnes]

Visite "Conseil"

Objectif : Conseil personnalisé

Réalisation :

- Lors de la visite "diagnostic" *[141 Cas]*
- Sur demande *(Après réception du compte-rendu ou lors de réunion publique)*

[Bilan (fin de phase 1) : 52% de visite "Conseil"]

Phase 2 : Contrôle

Objectif : Vérifier l'exécution des travaux *[Zone d'exécution : hors zone brûlée - 205 propriétaires]*

Calendrier : Janvier à Mai 2004




Travaux entièrement réalisés



Travaux insuffisants



Travaux n'ayant pas débuté



Observatoire de la forêt méditerranéenne

Compte-rendu :

- Travaux initialement satisfaisant : 15 %
- Travaux entièrement réalisés (*hors voie d'accès*) : 31% *[SANS SUITE]*
- Travaux en cours ou insuffisants : 41% *[COURRIER DE RELANCE (avec nouveau délai)]*
- Travaux n'ayant pas débuté : 13% *[MISE EN DEMEURE]*

Ressource : Commune



Problèmes rencontrés

- Ecartement des houppiers
- Densité des arbres (volume de bois)
- Arbres dangereux
- Devis des entreprises
- Qualification des entreprises



Phase 3 : Sanctions

Objectif : Vérifier l'impact de la phase "contrôle" et engager une procédure

Moyens :

- 2ème visite de contrôle (mai – juin 04)
 - [85 courriers de relance ➤ 8 sans évolutions]
 - [26 mises en demeure ➤ 3 sans effet]
- Engager une procédure
- [Nécessité d'un partenaire assermenté]

Rendu de la mission :

- Photographie Aérienne
 - Fichier papier (par propriétaire.)
 - Compte Rendu des visites (informatique)
 - Mise en place du suivi (C.C.F.F)
- Mission complète :** *Grimaud, La Garde Freinet*
Mission Partielle : *Vidauban, Sainte Maxime*
Assistance technique & de Formation : *CPA*

Bilan global de la mission (1^{er} juin 2004) :

- Quantitatif : 90% des maisons avec 50m (95% estimé au 1^{er} juillet 2004)
 - Calendrier total : 18 mois
 - Coût de l'animation : 60€ / habitation
- Forte attente des propriétaires pour du conseil
- Conditions de réussite : Action exhaustive
Affirmer la volonté d'aboutir

François JOLICLERCQ - EGA

Rencontres Incendies de forêt du 14 juin 2004
